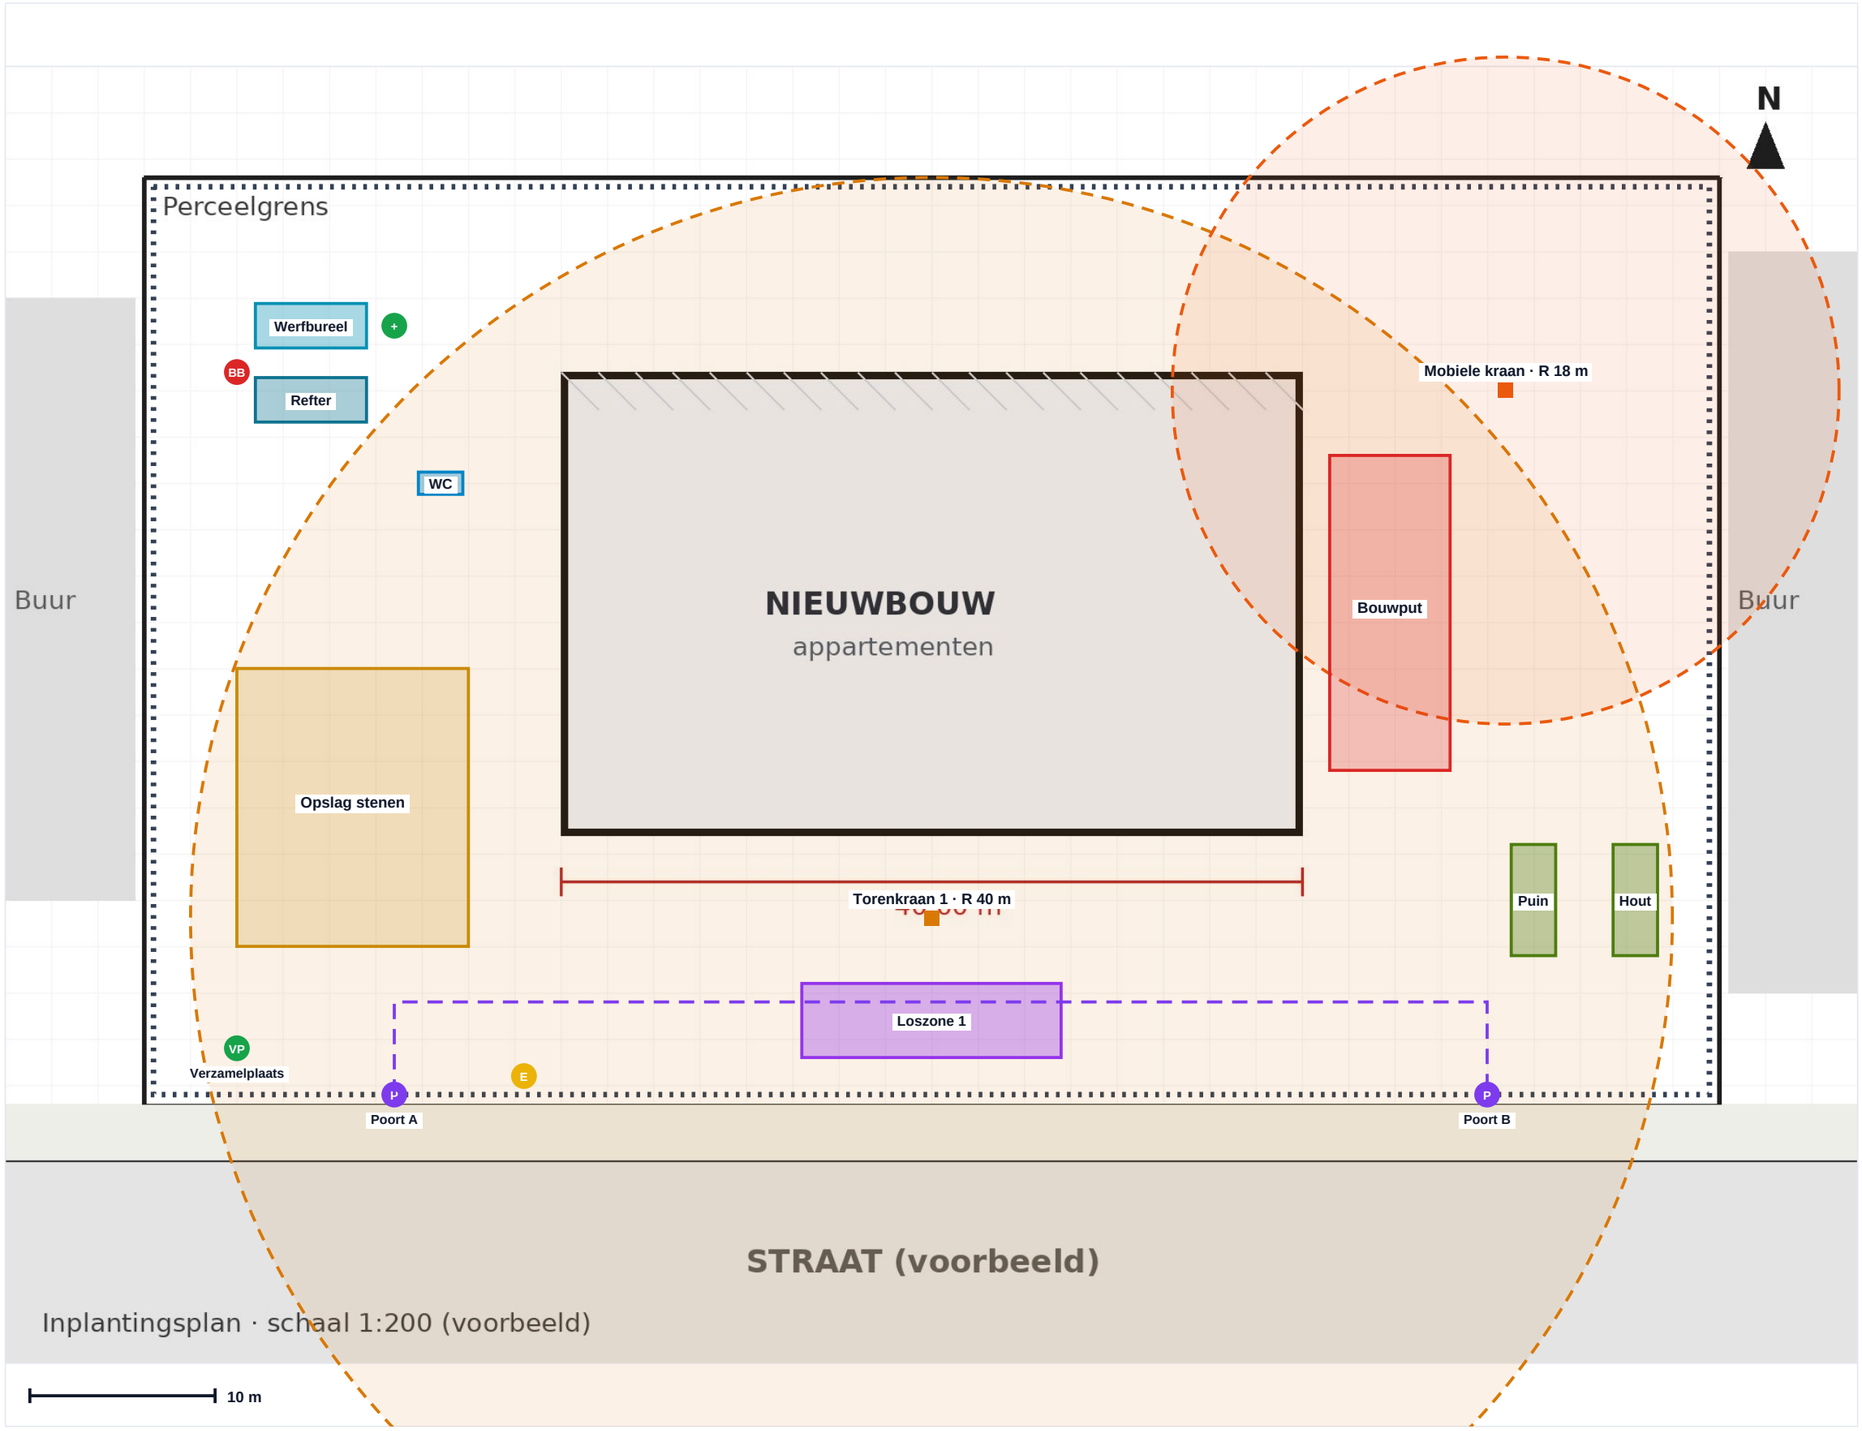


LEGENDE

Werfhek	266 m
Torenkraan	R 40 m
Mobiele kraan	R 18 m
Poort / toegang (2)	
Los- en laadzone	56 m²
Werfkeet / bureel	14 m²
Refter / kleedruimte	14 m²
Sanitair (toilet)	2,9 m²
Afvalcontainer (2)	29 m²
Opslagzone	188 m²
Rijroute werfverkeer	69 m
EHBO-post	
Brandblusser	
Verzamelplaats	
Werfkast (stroom)	
Gevarenzone / verboden	111 m²

AANDACHT

• De zwenkzones van Torenkraan 1 en Mobiele kraan overlappen (16 m). Spreek een werkvolgorde af of voorzie anticollisie.

• Torenkraan 1 draait voor ongeveer 44% buiten het werfhek. Geen lasten boven openbaar domein of buren zonder afspraken of toelating.

• Mobiele kraan draait voor ongeveer 56% buiten het werfhek. Geen lasten boven openbaar domein of buren zonder afspraken of toelating.

AANDACHTSPUNTEN · 13/16

- [x] De werf is afgesloten voor derden (werfhek)
- [x] Toegang en poort zijn aangeduid
- [x] Er is een rijroute voor werfverkeer, gescheiden van voetgangers waar mogelijk
- [x] Werfkeet of bureel voorzien
- [x] Refter- en kleedruimte voorzien
- [x] Sanitair voorzien, in verhouding tot het aantal werknemers
- [x] EHBO-post bereikbaar en aangeduid
- [x] Brandblussers bij keet, opslag en werkzones
- [x] Verzamelplaats bij evacuatie aangeduid
- [ ] Vluchtwegen vrij en aangeduid
- [ ] Zwenkzone van de kraan(en) bekeken: geen lasten boven openbaar domein of buren zonder afspraken
- [x] Los- en laadzone voorzien, binnen bereik van de kraan
- [x] Opslagzones voor materiaal aangeduid
- [x] Containers voor selectieve inzameling van bouwafval
- [ ] Werfstroom en water aangesloten
- [x] Signalisatie en vergunning voor inname openbaar domein geregeld

Geëxporteerd door Gebruiker · gebruiker@voorbeeld.be · Beheerder
Aangemaakt op 10-10-2026 14:18 (2026-10-10 12:18 UTC)
© 2026 OPTIMUM – JS Technologies. Alle rechten voorbehouden.

Dag	Uur	Leverancier	Materiaal	Voertuig	Poort	Loszone	Kraan	Contact	Status
ma 5 okt	07:30–09:00	Betoncentrale (voorbeeld)	Stortklaar beton C30/37 (24 m3)	Betonmixer	Poort A				geleverd
di 6 okt	08:00–09:30	Staalhandel (voorbeeld)	Wapeningsnetten (6 t)	Oplegger / dieplader	Poort A	Loszone 1	Torenkraan 1		geleverd
do 8 okt	09:00–10:00	Steenhandel (voorbeeld)	Snelbouwstenen (12 paletten)	Kraanwagen	Poort A	Loszone 1	Torenkraan 1		bevestigd
do 8 okt	09:30–11:00	Prefab (voorbeeld)	Breedplaatvloeren (2 vrachten)	Oplegger / dieplader	Poort B		Torenkraan 1		gepland
vr 9 okt	13:00–14:00	Bouwmaterialen (voorbeeld)	Mortel in silo (1 silo)	Vrachtwagen	Poort B				gepland
za 10 okt	16:30–17:30	Containerdienst (voorbeeld)	Wissel container puin (10 m3)	Containerwagen	Poort B				gepland

Let op: 3 levering(en) met een conflict (rood uur). Bekijk ze in OPTIMUM · Werflogistiek.

Opgemaakt met OPTIMUM · 10-10-2026 14:18. Praktische werfinrichting; volg het veiligheids- en gezondheidsplan en de afspraken met de veiligheidscoördinator.

Geëxporteerd door Gebruiker · gebruiker@voorbeeld.be · Beheerder
Aangemaakt op 10-10-2026 14:18 (2026-10-10 12:18 UTC)
© 2026 OPTIMUM – JS Technologies. Alle rechten voorbehouden.
